

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2020**

Bogotá D.C., marzo 2021

OBJETIVO

Realizar el seguimiento a los Proyectos de Inversión de la USPEC, de acuerdo con la información reportada al Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno -SISMEG, para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos para su ejecución a 31 de diciembre de 2020 y determinar la eficiencia y efectividad de los mismos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

ALCANCE

Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión dentro del presupuesto de la Entidad vigencia 2020, así como a la información reportada por la USPEC en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI, verificando los avances de las metas del Sistema Nacional de Gestión y Evaluación -SINERGIA, para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El presente informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión se realiza con corte al 31 de diciembre de 2020.

NORMATIVIDAD

En el presente ejercicio auditor se tendrán en cuenta las siguientes normas:

- Ley 38 de 1989 modificada por la Ley 179 de 1994.
- Ley 225 de 1995.
- Ley 489 de 1998.
- Ley 819 de 2003 *"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones"*.
- Documento CONPES 3294 de 2004- *"Renovación de la Administración Pública: Gestión por Resultados y Reforma del Sistema Nacional de Evaluación"*.
- Decreto 4730 de diciembre 28 de 2005 *"Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto"*.
- Decreto 875 de marzo 27 de 2008 - Artículo 23 - que establece la Oportunidad en el registro de proyectos de Inversión.
- Decreto 2844 de 2010 *"por la cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y del plan nacional de desarrollo"*.
- Resolución No. 000611 de 2013. *"Por la cual se asignan responsabilidades y funciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-SPI Hoy USPEC"*.
- Decreto 1290 de 2014 artículos 08 y 18.
- Decreto 111 de 1996.

- Decreto 178 de 2003.
- Decreto 2789 de 2004.
- Decreto 1957 de 2007.
- Decreto 4150 de 2011.
- Decreto 378 de 2016.
- Decreto 2088 de 2016.
- Resolución 450 de 2003.
- Régimen de Contabilidad Pública.
- Decreto 2170 de 2016.

METODOLGIA

Para efectos del análisis, la ejecución de los proyectos de inversión corresponde al porcentaje de las obligaciones frente a la apropiación vigente de cada proyecto de acuerdo con cifras registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF Nación II.

Con el fin de verificar y efectuar el respectivo seguimiento a información reportada por la Entidad, se procedió a verificar los registros en:

1. Sistema de Proyectos de Inversión SPI
2. Información de la Oficina de Gestión Contractual registrada en SECOP
3. Base de contratación con corte a 31 de diciembre de 2020
4. Base de pagos registrados en SIIF Nación, con corte a 31 de diciembre de 2020.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos estratégicos dan la USPEC, para la vigencia 2020 son los siguientes:

1. Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.
2. Fortalecimiento de la infraestructura física de los Eron a cargo del Inpec – Nacional.
3. Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.
4. Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.

5. Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional -Nacional

Cabe resaltar que para la vigencia 2020, la Entidad formula cuatro (5) objetivos estratégicos, los cuales se encuentran directamente relacionados con las gestiones misionales y encaminadas a la operación de la Entidad.


INDICADORES DE METAS DE GOBIERNO

Una vez verificado el Sistema de Información SINERGIA del DNP, se evidencia que a la fecha fueron actualizadas las metas de la Entidad con las metas de gobierno de acuerdo con la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019, mediante el cual se expide el Plan nacional de Desarrollo 2018-2022, "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".

Resumen Anual - Histórico

En el mes de abril no se realizó entrega cupos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente: INFRAESTRUCTURA MODULAR (2040 cupos) se encuentra en Fase 2 correspondiente a la ejecución de la obra, se adelantan actividades como: fundición de muros y placas de concreto pabellón, 3 estructuras metálicas de cubierta e instalaciones hidrosanitarias internas en patio, mampostería de concreto. CONSULTORÍAS: Popayán (800 cupos) Se recibió por parte de la interventoría toda la fase 3 del proyecto y se encuentra en aprobación por parte del INPEC. Buenaventura (600) desarrollando actividades de diseño arquitectónico, urbanístico, paisajístico, bioclimático, diseño geométrico de vías, señalética y mobiliario interior y exterior. Barrancabermeja (1500 cupos) se avanza en pre-dimensionamiento de estructura y redes, después de la aprobación de diseños de los edificios de acuerdo con la fase de anteproyecto. Villa Hermosa Cali (4500 cupos) se están realizando actividades correspondientes a la fase 1 como viabilidad técnica del proyecto, estudios de topografía y patología. INFRAESTRUCTURA RÍGIDA: Pereira (900 cupos) contrato ENTerritorio, se realizó socialización del proyecto con INPEC, Gobernación de Risaralda, Procuraduría, Defensoría y la Alcaldía de Pereira. Bellavista patio 2 (408 cupos) se han ejecutado actividades como: muros en concreto para segundo y tercer piso, instalaciones eléctricas, sanitarias y construcción de camastros en concreto, ERON Renacimiento (1.500 cupos) se encuentra en desarrollo de la Fase 2 donde se continúan adelantando actividades preliminares como el descapote y nivelación del terreno (Alrededor de 15.500 m2), adecuación y conformación de las vías internas, la realización de 4.100 ml de cerramiento provisional, la construcción de campamentos, la implementación de la PTAR provisional para el campamento, la construcción del pozo séptico, el levantamiento topográfico de nuevos componentes, la instalación e izaje de seis torre grúa, la implementación de dos plantas de concreto, el inicio de la perforación mecánica de un segundo pozo de agua profunda, el inicio de las actividades de urbanismo y así mismo, el inicio de la cimentación

para el cerramiento definitivo. ERON Riohacha (1500 cupos), Se revisó con el contratista de obra el trámite a realizar con CORPOGUAJIRA, los requisitos y documentación necesaria para el trámite de permiso de Aprovechamiento Forestal, para la implantación del proyecto. Medellín P4 (520 cupos) los contratistas se encuentran realizando la apropiación de los diseños, el 20 de abril se adjudicó el proceso USPEC CM-A-006-2021 correspondiente a la interventoría.

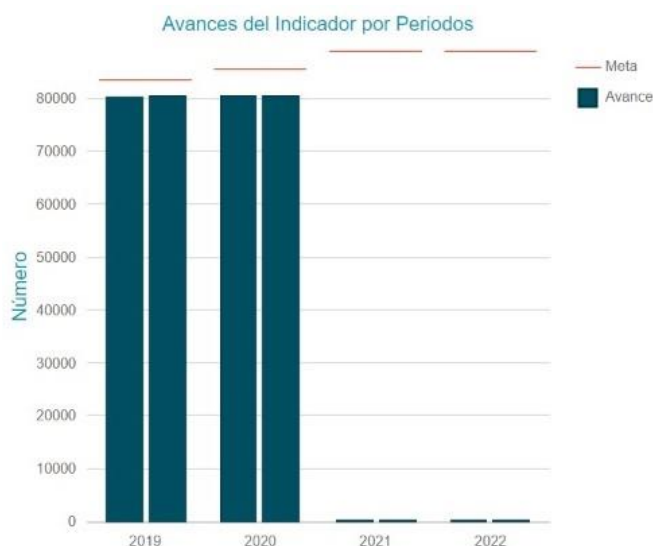

Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/?#IndicadorProgEntE/33/946/6158/83>

COMPORTAMIENTO ANUAL DEL INDICADOR

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea Base	-	80.227,00	-
Ene-Dic 2019	83.619,00	80.579,00	10.3800%
Ene-Dic 2020	85.539,00	80.579,00	6.6300%
Ene-Dic 2021	88.887,00	-	-
Ene-Dic 2022	88.887,00	-	-
2018-2022	88.887,00	80.579,00	4.0700%

Descripción del Indicador:

El indicador mide el número de cupos entregados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los actuales y en los nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) durante el cuatrienio.

Metas de gobierno:

Metas de gobierno:

2018-2022	Ene-Dic 2019	Ene-Dic 2020	Ene-Dic 2021	Ene-Dic 2022
88.887,00	83.619,00	85.539,00	88.887,00	88.887,00

Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/?#Programas/>

GESTIÓN FINANCIERA

El Decreto 2482 de 2012 compone la Planeación y la Gestión de las Entidades, como instrumento de articulación y reporte de la Planeación y adopta las políticas de Desarrollo Administrativo, entre otras las de Gestión Financiera que es la política integrada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la Entidad. Constituye las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios y la gestión de proyectos de inversión.

Para la vigencia 2020, el rubro de inversión está conformado por cinco (5) proyectos de inversión, los cuales se relacionan a continuación:

2018011000292 - IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL.

2018011000317- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - NACIONAL.

2018011000329- CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN – NACIONAL

2018011000336- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC – NACIONAL

2018011000466- FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

2018011000292 - Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.

Objetivo General

Mejorar los espacios para el desarrollo de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del Orden Nacional.

Objetivos Específicos

- Contar con las áreas necesarias para la realización de audiencias judiciales en los ERON
- Ampliar la cobertura de la realización de audiencias judiciales en los ERON

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos

Evolución segundo semestre 2020

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	2.900.229.150
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,80%

Este proyecto cuenta con una apropiación por valor de \$3.408.000.000, se han obligado \$0 y pagado un valor de \$0, correspondiente al avance Financiero del 0,00%, Físico 0,00%, y de Gestión 19,80%, a diciembre 2020 valor solicitado \$5.151.716.669, en la ejecución del proyecto de inversión relacionado.

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2020&periodo=12&proyecto=2018011000292>

Proyecto 2018011000317- Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional

Objetivo general

Fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de la población privada de la libertad.

Objetivos específicos

- Mejorar el sistema de recolección y custodia de las evidencias de la comisión de delitos
- Aumentar los recursos técnicos y tecnológicos de apoyo a la seguridad en los ERON

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos

Evolución segundo semestre 2020

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	3.781.023.726
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%

Mediante a la verificación realizada en el SPI, se evidencia una apropiación por valor de \$4.000.000.000, en el segundo semestre de 2020 se ha solicitado \$5.962.927.718, se han obligado \$0, pagado un valor de \$0, y comprometido \$3.598.039.700, correspondiente al avance Financiero del 0,00%, Físico 00,00%, y de Gestión 30,00% en la ejecución del proyecto con corte del segundo semestre de 2020, con un saldo inicial de \$4.000.000.000 y vigente \$3.781.023.726.

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2020&periodo=12&proyecto=2018011000317>

Proyecto 2018011000329- Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.

Objetivo general

Disminuir el hacinamiento en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional

Objetivos específicos

- Aumentar el número de cupos penitenciarios y carcelarios para atender a la PPL
- Obtener información técnica eficiente para dar viabilidad a nuevos proyectos de construcción y ampliación de cupos

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.

Evolución segundo semestre 2020

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión	250.934.440.000	250.934.440.000	250.934.440.000	250.934.440.000	250.934.440.000	236.411.297.608
Avance Financiero	2,11%	2,20%	2,29%	2,38%	2,48%	8,60%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	37,80%	37,20%	45,90%	51,90%	55,50%	82,10%

Conforme al presente proyecto se evidencia una apropiación por valor de \$250.934.440.000, se han obligado \$20.341.221.744, comprometido \$210.584.150.605 y pagado un valor de \$20.341.221.744, correspondiente al avance Financiero del 8,60%, Físico 0,00%, y de Gestión 82,10% en la ejecución del proyecto con corte 31 de diciembre de 2020.

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2020&periodo=12&proyecto=2018011000329>

Proyecto 2018011000336 - Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional

Objetivo general

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la Población Privada de la Libertad en los ERON

Objetivos específicos

- Adecuar la Infraestructura física de los ERON
- Fortalecer el tratamiento de agua potable y residual en los ERON

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.

Evolución segundo semestre 2020

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión	120.492.000.000	120.492.000.000	120.492.000.000	120.492.000.000	120.492.000.000	100.386.995.295
Avance Financiero	19,90%	20,77%	21,26%	24,78%	26,16%	38,30%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Avance Gestión	53,10%	55,85%	60,10%	61,50%	66,15%	69,55%

En el presente proyecto se encuentra una apropiación por valor de \$120.492.000.000, se han obligado \$38.443.284.124, comprometido \$98.236.844.297 y pagado un valor de \$38.443.284.124, correspondiente al avance Financiero del 38,30%, Físico 100,00%, y de Gestión 69,55% en la ejecución del proyecto con corte a diciembre de 2020.

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2020&periodo=12&proyecto=2018011000336>

Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.

Objetivo general

Fortalecer la aplicación de la Gestión Documental

Objetivos específicos

- Implementar herramientas tecnológicas del Sistema de Gestión Documental
- Generar buenas prácticas en los procesos Archivísticos de la entidad

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa: 1299 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector justicia y del derecho

Evolución segundo semestre 2020

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000
Avance Financiero	14,62%	32,75%	32,75%	32,75%	32,75%	85,40%
Avance Físico	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Avance Gestión	58,30%	58,30%	58,30%	58,30%	58,30%	100,00%

El presente proyecto se encuentra una apropiación por valor de \$ \$420.000.000, se han obligado \$358.660.313, comprometido \$420.000.000 y pagado un valor de \$358.660.313, correspondiente al avance Financiero del 85,40%, Físico 100,00%, y de Gestión 100,00% en la ejecución del proyecto con corte a diciembre de 2020.

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2020&periodo=12&proyecto=201801100046>

6

AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE A 30 DE DICIEMBRE 2020
1. 2018011000292 - Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.	\$3.408.000.000	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 19,80% De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2020 no se evidencian pagos realizados durante la vigencia 2020 en el presente proyecto de inversión.
2. 2018011000317- Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional - Nacional.	\$4.000.000.000	Financiero: 0,00% Físico: 00,00% Gestión: 30,00% De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2020 no se evidencian pagos realizados durante la vigencia 2020 en el presente proyecto de inversión.
3. 2018011000329- Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden - Nacional	\$250.934.440.000	Financiero: 8,60% Físico: 0,00% Gestión: 82,10% De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se realizaron 443 pagos los cuales suman un total de \$20'341.221.743,73,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se evidencian 122 Contratos de Prestación de Servicios y prestación de servicios profesionales los suman un valor de \$ 2'172.224.996,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se realizaron 2 pagos de Orden de compras las cuales suman un valor de \$ 6'106.289,00



		De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se realizaron 6 pagos de resoluciones para garantizar pagos de comisiones y pagos exigibles, así como pagos al Consorcio Urbaespinal, los pagos suman un valor de \$ 17'390.865.598,23,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se realizaron 2 pagos por contratos de obras los cuales suman un valor de \$616'231.988,50 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se evidencian 6 pagos por contratos de interventorías los suman un valor de \$133'558.411,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se evidencian 6 pagos de actos administrativos (pago comisiones) los suman un valor de \$22'234.461,00
4. 2018011000336- Fortalecimiento de la infraestructura física de los Eron a cargo del Inpec – Nacional	\$120.492.000.000	Financiero: 38,30% Físico: 100,00% Gestión: 69,55% Una vez verificado en el CEN de pagos, se evidencia que a 30 de diciembre de 2020 se realizaron 546 pagos los cuales suman un valor de \$38'443.684.124,10. Discriminados de la siguiente manera: De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se realizaron 2 pagos de resoluciones para garantizar pagos de pagos exigibles de pasivos y vigencias expiradas los pagos suman un valor de \$ 77'842.627,00,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se realizaron 2 pagos de Orden de compras las cuales suman un valor de \$ 9'336.688,00,00



		De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se evidencia 1 pago de orden administrativo (pago comisión) el cual es de un valor de \$360.459,00,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se evidencian 416 Contratos de Prestación de Servicios y prestación de servicios profesionales los suman un valor de \$ 2'277.178.402,34,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se realizaron 42 pagos por contratos de obras los cuales suman un valor de \$32'957.439.394,76,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se evidencian 24 pagos por contratos de interventorías los suman un valor de \$3'101.753.400,00,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de diciembre de 2020 se evidencian 59 pagos de actos administrativos (pago comisiones y viáticos) los suman un valor de \$19'773.198,00,00
5. 2018011000466- Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.	\$420.000.000	Financiero: 85,40% Físico: 100,00% Gestión: 100,00% Una vez verificado en el CEN de pagos, se evidencia que a 30 de diciembre de 2020 se realizaron 3 pagos los cuales suman un valor de \$358'660.313,00,00. se evidencia que los 3 pagos realizados dentro del proyecto de inversión fueron realizados por concepto de Contratos de Prestación de Servicios.

* A continuación se amplía información sobre los 42 contratos de obra realizados en el marco del proyecto de inversión Fortalecimiento de la infraestructura física de los Eron a cargo del Inpec – Nacional.



TIPO DOC SOPORTE COMPROMISO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	FECHA DE PAGO	VALOR PESOS
CONTRATO DE OBRA	901381517	CONSORCIO ERON	2020-06-19 03:17:14	5.571.869.990,00
CONTRATO DE OBRA	804002715	BUILDING SAS	2020-06-30 03:28:09	2.523.448.293,00
CONTRATO DE OBRA	901382252	CONSORCIO MANTENIMIENTO CARCELARIO	2020-06-30 03:29:19	1.701.643.965,00
CONTRATO DE OBRA	901382069	CONSORCIO ERON 2020	2020-07-14 03:43:59	257.138.347,00
CONTRATO DE OBRA	901382069	CONSORCIO ERON 2020	2020-07-14 03:43:49	4.305.399.396,00
CONTRATO DE OBRA	901383436	CONSORCIO MTO ERON 2020	2020-08-04 05:39:33	3.882.831.946,00
CONTRATO DE OBRA	901381631	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020	2020-08-14 03:28:36	2.156.467.576,00
CONTRATO DE OBRA	901382147	CONSORCIO OLAGUER- CALDAS	2020-08-06 03:49:48	2.630.384.868,00
CONTRATO DE OBRA	901383436	CONSORCIO MTO ERON 2020	2020-09-30 03:40:14	62.855.331,00
CONTRATO DE OBRA	901383436	CONSORCIO MTO ERON 2020	2020-10-01 04:11:10	64.861.501,51
CONTRATO DE OBRA	901383436	CONSORCIO MTO ERON 2020	2020-10-07 03:18:19	150.376.122,12
CONTRATO DE OBRA	901263865	CONSORCIO SIP ERON	2020-10-07 03:18:40	30.276.096,00
CONTRATO DE OBRA	901382147	CONSORCIO OLAGUER- CALDAS	2020-10-09 03:38:07	107.858.027,00
CONTRATO DE OBRA	901381517	CONSORCIO ERON	2020-10-21 03:44:16	68.478.895,00
CONTRATO DE OBRA	900176059	UNINGECOL S.A.	2020-10-20 03:35:12	42.824.868,00
CONTRATO DE OBRA	900209944	STARCONCALIDAD LTDA	2020-10-20 03:30:25	36.350.087,00
CONTRATO DE OBRA	804002715	BUILDING SAS	2020-10-21 03:41:21	26.204.632,00



CONTRATO DE OBRA	901382252	CONSORCIO MANTENIMIENTO CARCELARIO	2020-10-21 03:49:07	526.564.047,08
CONTRATO DE OBRA	901381517	CONSORCIO ERON	2020-10-30 04:16:07	123.182.798,00
CONTRATO DE OBRA	901381517	CONSORCIO ERON	2020-10-30 04:03:29	252.825.826,00
CONTRATO DE OBRA	901381517	CONSORCIO ERON	2020-10-30 04:03:16	604.467.995,88
CONTRATO DE OBRA	901381517	CONSORCIO ERON	2020-11-03 03:50:39	146.171.161,12
CONTRATO DE OBRA	804002715	BUILDING SAS	2020-11-06 07:22:11	303.002.735,00
CONTRATO DE OBRA	804002715	BUILDING SAS	2020-11-06 07:22:11	256.134.076,00
CONTRATO DE OBRA	901382252	CONSORCIO MANTENIMIENTO CARCELARIO	2020-11-09 04:05:00	1.073.398.679,00
CONTRATO DE OBRA	901382147	CONSORCIO OLAGUER-CALDAS	2020-11-10 03:59:37	1.062.384.004,00
CONTRATO DE OBRA	19289121	GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	2020-11-25 03:44:39	38.999.974,00
CONTRATO DE OBRA	901241208	CONSORCIO OBRAS CIVILES	2020-12-04 03:26:35	43.372.727,00
CONTRATO DE OBRA	901381631	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020	2020-12-07 04:11:24	23.697.989,12
CONTRATO DE OBRA	901382147	CONSORCIO OLAGUER-CALDAS	2020-12-07 04:22:57	494.500.318,00
CONTRATO DE OBRA	804002715	BUILDING SAS	2020-12-16 03:39:23	273.172.641,00
CONTRATO DE OBRA	901383436	CONSORCIO MTO ERON 2020	2020-12-16 03:36:27	690.626.193,60
CONTRATO DE OBRA	901381631	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020	2020-12-17 03:27:50	291.846.171,36
CONTRATO DE OBRA	901382147	CONSORCIO OLAGUER-CALDAS	2020-12-21 03:23:53	1.021.092.991,00

CONTRATO DE OBRA	830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA	2020-12-22 03:46:16	630.218.928,00
CONTRATO DE OBRA	901381631	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020	2020-12-23 01:10:45	550.177.375,27
CONTRATO DE OBRA	901382069	CONSORCIO ERON 2020	2020-12-28 02:30:50	121.487.703,60
CONTRATO DE OBRA	901320615	CONSORCIO MANTENIMIENTO USPEC	2020-12-30 03:29:18	8.865.500,00
CONTRATO DE OBRA	901320615	CONSORCIO MANTENIMIENTO USPEC	2020-12-30 03:29:17	18.165.069,00
CONTRATO DE OBRA	901320615	CONSORCIO MANTENIMIENTO USPEC	2020-12-30 03:21:13	162.224.225,00
CONTRATO DE OBRA	901381631	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020	2020-12-30 03:23:06	540.401.828,10
CONTRATO DE OBRA	901320615	CONSORCIO MANTENIMIENTO USPEC	2020-12-30 03:20:57	81.188.453,00

CONCLUSIONES

- El comportamiento de las obligaciones refleja que con corte a 31 de diciembre de 2020 no se realizó ejecución presupuestal correspondiente a los rubros de **Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional, Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional – Nacional**. Lo anterior permite determinar que existen debilidades de planeación en la ejecución de los recursos.
- El rubro del proyecto de inversión **Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá**, para el segundo semestre de 2020, presentó ejecución presupuestal bastante significativo, además, a nivel físico y de gestión su ejecución fue del 100%, lo cual permite determinar que se adoptaron las medidas necesarias para la ejecución de los recursos dispuestos para el presente proyecto.
- En cuanto a las obligaciones de ejecución presupuestal correspondiente a los rubros de **Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional y Fortalecimiento de la**

infraestructura física de los Eron a cargo del Inpec – Nacional aunque en el primer rubro hubo un notorio gasto, este no es suficiente teniendo en cuenta que las apropiaciones de los rubros son bastante significativas, por lo tanto se determina que existen debilidades de planeación en la ejecución de los recursos, sin embargo, el segundo rubro tuvo avances significativos en cuanto a su avance físico se ejecutó el 100% y gestionó 69,55%, aunque el avance financiero continua deficiente, se puede determinar que para mejores resultados es necesario realizar una buena planeación para los recursos que se destinan a cada proyecto.

- Para el ultimo semestre el proyecto de inversión Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá, demostró un avance bastante significativo a nivel financiero, lo cual indica que se puede mejorar en la gestiones a nivel financiero realizando planes de acción para la buena y sana ejecución de los recursos.

8. RECOMENDACIONES.

- Realizar una planeación en cada proyecto de inversión, la cual permita la buena ejecución de los recursos.
- Realizar mesas de trabajo donde se analice cuales fueron o son los factores que no permitieron realizar los avances financieros, físicos y de gestiones en cada proyecto de inversión, lo anterior con el objetivo de encontrar las posibles causas y las acciones de mejora.



ALEXI MAUREDY PERDOMO BAMBAGUE
Coordinadora Grupo Evaluación de la Gestión Institucional

Elaboró: [Natali Padrón Aguilar- Profesional Universitario](#) 

Revisó: [Alexi Mauredy Perdomo Bambague- Coordinadora Grupo Evaluación de la Gestión Institucional](#) 

Ruta:

Ubicación archivo físico:
