



UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2021

Bogotá D.C., febrero 2022



OBJETIVO

Realizar el seguimiento a los Proyectos de Inversión de la USPEC, de acuerdo con la información reportada al Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno -SISMEG, para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos para su ejecución a 31 de diciembre de 2021 y determinar la eficiencia y efectividad de los mismos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

ALCANCE

Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión dentro del presupuesto de la Entidad vigencia 2021, así como a la información reportada por la USPEC en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI, verificando los avances de las metas del Sistema Nacional de Gestión y Evaluación -SINERGIA, para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El presente informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión se realiza con corte al 31 de diciembre de 2021.

NORMATIVIDAD

En el presente ejercicio auditor se tendrán en cuenta las siguientes normas:

Ley 38 de 1989 modificada por la Ley 179 de 1994.

Ley 225 de 1995.

Ley 489 de 1998.

Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".

Documento CONPES 3294 de 2004- "Renovación de la Administración Pública: Gestión por Resultados y Reforma del Sistema Nacional de Evaluación".

Decreto 4730 de diciembre 28 de 2005 "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto".

Decreto 875 de marzo 27 de 2008 - Artículo 23 - que establece la Oportunidad en el registro de proyectos de Inversión.

Decreto 2844 de 2010 "por la cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y del plan nacional de desarrollo".

Resolución No. 000611 de 2013. "Por la cual se asignan responsabilidades y funciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-SPI Hoy USPEC".

Decreto 1290 de 2014 artículos 08 y 18.

Decreto 111 de 1996.

Decreto 178 de 2003.

Decreto 2789 de 2004.

Decreto 1957 de 2007.

Decreto 4150 de 2011.

Decreto 378 de 2016.

Decreto 2088 de 2016.

Resolución 450 de 2003.

Régimen de Contabilidad Pública.

Decreto 2170 de 2016.

METODOLOGIA

Para efectos del análisis, la ejecución de los proyectos de inversión corresponde al porcentaje de las obligaciones frente a la apropiación vigente de cada proyecto de acuerdo con cifras registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF Nación II.



Con el fin de verificar y efectuar el respectivo seguimiento a información reportada por la Entidad, se procedió a verificar los registros en:

- Sistema de Proyectos de Inversión SPI
- Información de la Oficina de Gestión Contractual registrada en SECOP
- Base de contratación con corte a 31 de diciembre de 2021
- Base de pagos registrados en SIIF Nación, con corte a 31 de diciembre de 2021.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos estratégicos dan la USPEC, para la vigencia 2021 son los siguientes:

Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.

Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC.

Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.

Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.

Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.

Cabe resaltar que para la vigencia 2021, la Entidad formula cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales se encuentran directamente relacionados con las gestiones misionales y encaminadas a la operación de la Entidad.

INDICADORES DE METAS DE GOBIERNO

Una vez verificado el Sistema de Información SINERGIA del DNP, se evidencia que a la fecha fueron actualizadas las metas de la Entidad con las metas de gobierno de acuerdo con la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019, mediante el cual se expide el Plan nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Resumen Anual – Histórico


En el mes de diciembre se realizó la entrega de 952 cupos carcelarios y penitenciarios, correspondientes a: 32 cupos rehabilitados en el EPMSC Sevilla y 920 cupos en Infraestructura Rígida de los establecimientos de Medellín Bellavista Patio 2 (410 cupos) y (510 cupos) de infraestructura modular en Santa Marta. En cuanto a estos 920 cupos se realizó entrega para garantizar a la Población Privada de la Libertad espacios óptimos y adecuados, sin embargo, el soporte de esta entrega será cargado en el sistema en el mes siguiente, debido a que se encuentra pendiente de firmas del INPEC. INFRAESTRUCTURA RÍGIDA: Pereira (1.500 cupos) Se continua descapote de terreno natural, aperturas de vías y senderos para facilitar el tránsito de vehículos de carga para retiro de residuos de actividades, levantamiento topográfico. Renacimiento (1.500 cupos) se adelanta la conformación de la estructura metálica de la PTAP y de la PTAR, elaboradas in situ y trasladadas a la ubicación final en obra para el ensamble de los tanques de tratamiento y construcción de las casetas de control para cada producto. Riohacha (1500 cupos) Se realizaron las aprobaciones de los APUS ambientales y de aprovechamiento forestal. INFRAESTRUCTURA MODULAR (1.530 cupos) Barranquilla: Construcción de pilotes del cerramiento y vigas de cimentación, Instalación de cerramiento perimetral, Cartagena: se adelantan actividades eléctricas, de iluminación, red interna entre los bloques, actividades de urbanismo y terminación cerramiento y garita, Itagüí: Se inicia con el armado de acero, encofrado y fundida para los muros de camastros en el segundo nivel y se continúa con la instalación y fabricación de la estructura metálica para la cubierta. CONSULTORÍAS: Popayán (800 cupos) fase 5 ajustes finales para cierre y liquidación. Buenaventura (600 cupos) y Barrancabermeja (1500 cupos) fase 5 ajustes finales para cierre y liquidación. Villa Hermosa Cali (4500 cupos) esquema de implantación y propuesta arquitectónica espacial. En resumen, en el segundo semestre de 2021 se realizó entrega de 3.789 cupos,



correspondientes a 920 cupos en Infraestructura Rígida de los establecimientos de Medellín Bellavista Patio 2 (410 cupos) y Santa Marta (510 cupos) de infraestructura modular; y en cuanto a cupos rehabilitados 2.869 cupos (recuperación de espacios), con las intervenciones estructurales generadas dentro de los camastros y celdas en los establecimientos de: ERON BUGA PATIO 6 (271cupos), EPMSC GRANADA (14cupos), EPMSC JP CHIQUINQUIRÁ (40cupos), EPMSC DUITAMA (6cupos), EPMS SOGAMOSO (28cupos), EPAMS CAS CÓMBITA (4cupos), EPMSC FLORENCIA (CUNDUY) (8cupos), EP FLORENCIA (HELICONIAS) (74 cupos), EPMSC GIRARDOT (27cupos), EPMSC GARZÓN (9cupos), EPMSC RM NEIVA (13cupos), EPMSC ACACÍAS (72cupos), EPMSC CHAPARRAL (4cupos), COCUC (348cupos), EPMS SAN GIL (16cupos), EPAMS GIRÓN (188cupos), EPMSC BARRANQUILLA (BOSQUE) (29cupos), EPAMSCAS VALLEDUPAR (ERM TRAMACUA) (72cupos), EPMSC VALLEDUPAR (JUDICIAL) (82cupos), EPMSC EL BANCO (8cupos), EPMSC SAN ANDRES (6cupos), EPMSC COIBA IBAGUÉ (135cupos), EPAMS LA DORADA (134cupos), EPMSC PEREIRA (18cupos), RM ARMENIA (12cupos), EPMSC CALARCÁ (120cupos), EPMSC ANSERMA CALDAS (20cupos), EPMSC RIOSUCIO (25cupos), EPMSC SANTA ROSA DE CABAL (4cupos), RM MANIZALES (8cupos), RM PEREIRA (76cupos), EPMSC ARMENIA (32cupos), EPMSC BOLÍVAR CAUCA (40cupos), EPMSC EL BORDO (6cupos), EPMSC PUERTO TEJADA (8cupos), EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO (36cupos), EPMSC SILVIA (30cupos), CPAMS POPAYÁN (20cupos), EPMSC RM PASTO (31cupos), EPMSC IPIALES (24cupos), EPMSC LA UNIÓN (21cupos), EPAMSCAS PALMIRA (120cupos), EPMSC CALI (100cupos), EPMSC BUGA (53cupos), EPMSC BUENAVENTURA (66cupos), CPMS TULUÁ (74cupos), EPMSC CARTAGO (62cupos), EPMSC SEVILLA (54cupos), COJAMUNDI (189cupos), EPMSC SEVILLA (32cupos).

Fecha de corte: 31/12/2021

Fecha de actualización: 02/02/2022

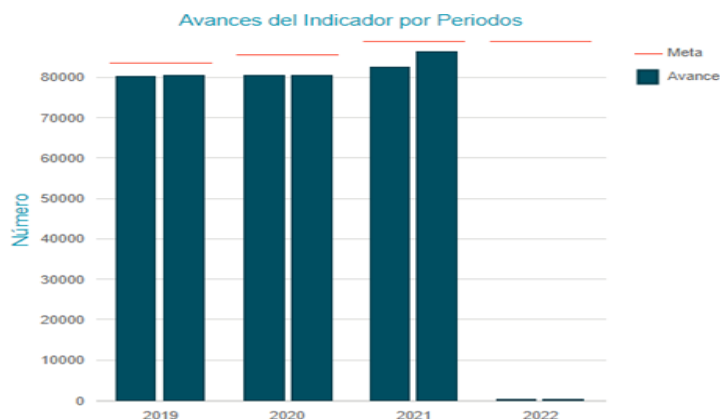

Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/946/6158/83>

COMPORTAMIENTO ANUAL DEL INDICADOR

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea Base	-	80.227,00	-
Ene-Dic 2019	83.619,00	80.579,00	10.3800%
Ene-Dic 2020	85.539,00	80.579,00	6.6300%
Ene-Dic 2021	88.887,00	86.326,00	70.4300%
Ene-Dic 2022	88.887,00	-	-
2018-2022	88.887,00	86.326,00	70.4300%



Descripción del Indicador:

El indicador mide el número de cupos entregados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los actuales y en los nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) durante el cuatrienio.

Metas de gobierno:

2018-2022	Ene-Dic 2019	Ene-Dic 2020	Ene-Dic 2021	Ene-Dic 2022
88.887,00	83.619,00	85.539,00	88.887,00	88.887,00

Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/946/6158/83>

GESTIÓN FINANCIERA

El Decreto 2482 de 2012 compone la Planeación y la Gestión de las Entidades, como instrumento de articulación y reporte de la Planeación y adopta las políticas de Desarrollo Administrativo, entre otras las de Gestión Financiera que es la política integrada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la Entidad. Constituye las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios y la gestión de proyectos de inversión.

Para la vigencia 2020, el rubro de inversión está conformado por cinco (5) proyectos de inversión, los cuales se relacionan a continuación:

- 2018011000292 - IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL.
- 2018011000317- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - NACIONAL.
- 2018011000329- CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN – NACIONAL
- 2018011000336- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC – NACIONAL
- 2018011000466- FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto 2018011000292 - Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.

Objetivo General

Mejorar los espacios para el desarrollo de audiencias y diligencias judiciales en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.



Objetivos Específicos

Contar con las áreas necesarias para la realización de audiencias judiciales en los ERON
Ampliar la cobertura de la realización de audiencias judiciales en los ERON

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos

Evolución a 31 de diciembre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Este proyecto cuenta con una apropiación por valor de \$3.408.000.000, se han obligado \$0 comprometido \$3.266.772.323 y pagado un valor de \$0, correspondiente al avance Financiero del 0,00%, Físico 0,00%, y de Gestión 0,00%, a 30 de diciembre de 2021 valor solicitado \$6.940.614.421, en la ejecución del proyecto de inversión relacionado.

Fuente: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000292>

Proyecto 2018011000317- Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional

Objetivo general

Fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de la población privada de la libertad.

Objetivos específicos

Mejorar el sistema de recolección y custodia de las evidencias de la comisión de delitos

Aumentar los recursos técnicos y tecnológicos de apoyo a la seguridad en los ERON

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos

Evolución a 31 de diciembre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,60%



Mediante a la verificación realizada en el SPI, se evidencia una apropiación por valor de \$4.000.000.000, en el último semestre de 2021 se solicitó \$5.168.759.489, se obligó \$0, pagado un valor de \$0, y se comprometió \$2.337.673.068, correspondiente al avance Financiero del 0,00%, Físico 55,00%, y de Gestión 64,60% en la ejecución del proyecto con corte del último semestre de 2021, con un saldo inicial de \$4.000.000.000 y vigente \$4.000.000.000.

Fuente: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000317>

Proyecto 2018011000329- Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.

Objetivo general

Disminuir el hacinamiento en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional

Objetivos específicos

Aumentar el número de cupos penitenciarios y carcelarios para atender a la PPL

Obtener información técnica eficiente para dar viabilidad a nuevos proyectos de construcción y ampliación de cupos

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.

Evolución a 31 de diciembre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652
Avance Financiero	0,00%	0,02%	0,08%	0,14%	0,21%	0,42%	0,50%	0,70%	2,37%	2,74%	3,21%	3,70%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%
Avance Gestión	1,50%	10,50%	28,20%	21,00%	27,60%	31,20%	34,50%	39,90%	43,20%	45,30%	49,80%	70,70%

Conforme al presente proyecto se evidencia una apropiación por valor de \$260.221.745.652, se obligó \$9.624.007.141, comprometió \$256.105.656.613 y pagó un valor de \$9.624.007.141, correspondiente al avance Financiero del 3,70%, Físico 21,00%, y de Gestión 70,70% en la ejecución del proyecto con corte 30 de diciembre de 2021.

Fuente: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000329>

Proyecto 2018011000336 - Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC

Nacional Objetivo general

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la Población Privada de la Libertad en los ERON

Objetivos específicos

Adecuar la Infraestructura física de los ERON

Fortalecer el tratamiento de agua potable y residual en los ERON



INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN CUARTO TRIMESTRE DE 2021

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.

Evolución a 31 de diciembre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734
Avance Financiero	0,00%	0,03%	0,13%	0,34%	0,58%	0,90%	1,21%	5,66%	9,85%	13,46%	14,38%	18,99%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,00%	27,00%	27,00%	56,00%	56,00%	74,00%	97,00%
Avance Gestión	2,10%	2,45%	4,00%	5,05%	7,90%	18,25%	19,85%	21,55%	22,90%	24,25%	39,85%	53,10%

En el presente proyecto se encontró una apropiación por valor de \$83.281.301.734, se obligó \$15.818.692.973, comprometió \$79.883.513.050 y pagó un valor de \$15.818.692.973, correspondiente al avance Financiero 18,99%, Físico 97,00%, y de Gestión 53,10% en la ejecución del proyecto con corte a 30 de diciembre de 2021.

Fuente: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000336>

2018011000466-Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.

Objetivo general

Fortalecer la aplicación de la Gestión Documental

Objetivos específicos

Implementar herramientas tecnológicas del Sistema de Gestión Documental

Generar buenas prácticas en los procesos Archivísticos de la entidad

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa: 1299 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector justicia y del derecho Evolución a 31 de diciembre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	86,70%

El presente proyecto se encontró una apropiación por valor de \$507.752.614, se obligó \$0, comprometido \$507.752.614 y pagó un valor de \$0, correspondiente al avance Financiero del 0,00%, Físico 0,00%, y de Gestión 86,70% en la ejecución del proyecto con corte a diciembre 30 de 2021.

Fuente: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000466>



INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN CUARTO TRIMESTRE DE 2021

AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE A 30 DE DICIEMBRE 2021
1. 2018011000292 - Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los Establecimientos de reclusión del orden Nacional.	\$3.408.000.000	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 00,00% De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 no se evidenciaron pagos realizados durante la vigencia 2021 en el presente proyecto de inversión.
2. 2018011000317- Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional - Nacional.	\$4.000.000.000	Financiero: 0,00% Físico: 55,00% Gestión: 64,60% De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 no se evidenciaron pagos realizados durante la vigencia 2021 en el presente proyecto de inversión.
3. 2018011000329- Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden - Nacional	\$260.221.745.652	Financiero 3,70% Físico 21,00% Gestión 70,70% De acuerdo al CEN de pagos, al 31 de diciembre de 2021 se realizó un total de 618 pagos los cuales suman un total de \$12'466.132.129,74 De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se evidenció 403 entre Contratos de Prestación de Servicios y prestación de servicios profesionales los cuales sumaron un valor de \$ 2'546.652.331,33. De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se realizaron 14 pagos por contratos de obras los cuales suman un valor de \$7'460.977.337,90 De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se evidencian 186 pagos de actos administrativos (pago comisiones) los suman un valor de \$95'653.860,00



INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN CUARTO TRIMESTRE DE 2021

		De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se evidenciaron 9 resoluciones las cuales sumaron un valor de \$ 1'873.862.104,80. De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se evidenciaron 2 contratos de interventoría los cuales suman se realizó por un valor de \$ 299'026.908,00. De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se evidenció un (1) contrato de consultoría el cual se realizó por un valor de \$ 121'584.219,40. De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se realizaron 3 órdenes de compras por un valor de \$68'375.548,31.
4. 2018011000336- Fortalecimiento de la infraestructura física de los Eron a cargo del Inpec – Nacional	\$83.281.301.734	Financiero: 18,99% Físico: 97,00% Gestión: 153,10% Una vez verificado en el CEN de pagos, se evidencia que a 31 de diciembre de 2021 se realizaron 751 pagos los cuales suman un valor de \$16'059.715.259,95. Discriminados de la siguiente manera:
		De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se evidencian 171 pagos de actos administrativos (pago comisiones) los suman un valor de \$75'968.611,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se evidenciaron 2 pagos de contratos de consultoría los suman un valor de \$4'550.000,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se evidenciaron 6 pagos de contratos de interventoría los suman un valor de \$288'048.240,74.
		De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se realizaron 3 pagos por contrato de obra por valor de \$1'226.460.968,42.
		De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se evidencian 513 Contratos de Prestación de Servicios y prestación de servicios profesionales los suman un valor de \$ 2'662.332.658,33 De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se evidencian 7 pagos de contratos interadministrativos los cuales suman un valor de \$ 2'483.844.210,00.
		De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 se evidencian 49 resoluciones las cuales suman un valor de \$ 9'318.510.571,46.
5. 2018011000466- Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.	\$507.752.614	Financiero: 00,00% Físico: 00,00% Gestión: 86,70% De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de diciembre de 2021 no se evidenciaron pagos realizados durante la vigencia 2021 en el presente proyecto de inversión.



INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN CUARTO TRIMESTRE DE 2021

A continuación, se amplía información sobre los 14 contratos de obra realizados en el marco del proyecto de inversión Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.

Fecha Doc Soporte Compromiso	Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso	Identificación	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Fecha de pago
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 272 DE 2020	ADICION 1 CONTRATO 272 DE 2020 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS SECTORES ANTIGUOS CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL EPAMS GIRON 15 DE MARZO DE 2021 HASTA	830045040	AQSERV S A S	142.835.206,00	2021-06-30 04:28:12
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS SECTORES ANTIGUOS CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL EPMSI IPALES, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	901415289	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	108.599.864,25	2021-06-30 04:39:27
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS SECTORES ANTIGUOS CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL EPMSI IPALES, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	901415289	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	95.013.608,75	2021-07-01 03:56:43
2021-01-04 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO 276 DE 2020	PARA GARANTIZAR RECURSOS VIGENCIA FUTURA 2021 PARA EL CONTRATO DE OBRA 276 de 2020, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPAR	901439396	CONSORCIO ERON LA GUAJIRA	2.829.164.989,00	2021-09-20 00:00:00
2021-01-04 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO 276 DE 2020	PARA GARANTIZAR RECURSOS VIGENCIA FUTURA 2021 PARA EL CONTRATO DE OBRA 276 de 2020, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPAR	901439396	CONSORCIO ERON LA GUAJIRA	2.829.164.989,00	2021-09-21 04:03:39
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 272 DE 2020	ADICION 1 CONTRATO 272 DE 2020 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS SECTORES ANTIGUOS CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL EPAMS GIRON 15 DE MARZO DE 2021 HASTA	830045040	AQSERV S A S	70.215.017,00	2021-09-29 05:23:41
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS SECTORES ANTIGUOS CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL EPMSI IPALES, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	901415289	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	145.955.836,00	2021-09-29 05:34:35
2021-06-22 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO 201 DE 2021	VIGENCIA 60 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PARA GARANTIZAR PAGO CONTRATO DE OBRA 201 DE 2021 EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SECTOR ANTIGUO CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN	900354526	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S	193.194.437,55	2021-09-29 05:23:27
2021-06-22 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO 201 DE 2021	VIGENCIA 60 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PARA GARANTIZAR PAGO CONTRATO DE OBRA 201 DE 2021 EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SECTOR ANTIGUO CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN	900354526	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S	514.164.429,18	2021-11-12 03:26:53
2021-09-22 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	261 DE 2021	PARA GARANTIZAR PAGO CTO OBRA 261 DE 2021 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA OPTIMIZAR LA INTEGRACIÓN FÍSICA DEL SECTOR ANTIGUO CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL EPMSI IPALES" de acuerdo con las especificaciones y exige	900335206	ZION CONSTRUCCIONES S.A.S.	60.691.128,51	2021-11-30 03:45:13
2021-11-04 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	OTRO SI 2 ADICION 1 CTO 201-21	PARA GARANTIZAR PAGO OTRO SI 2 ADICION 1 CTO OBRA 201 DE 2021 VIG HASTA (03/12/2021) OBJETO "EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SECTOR ANTIGUO CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL E	900354526	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S	279.296.670,92	2021-11-30 03:49:19
2021-06-22 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO 201 DE 2021	VIGENCIA 60 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PARA GARANTIZAR PAGO CONTRATO DE OBRA 201 DE 2021 EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SECTOR ANTIGUO CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN	900354526	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S	84.167.004,27	2021-12-15 03:46:16
2021-11-04 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	OTRO SI 2 ADICION 1 CTO 201-21	PARA GARANTIZAR PAGO OTRO SI 2 ADICION 1 CTO OBRA 201 DE 2021 VIG HASTA (03/12/2021) OBJETO "EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SECTOR ANTIGUO CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL E	900354526	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S	96.558.335,32	2021-12-15 03:27:42
2021-11-04 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	OTRO SI 2 ADICION 1 CTO 201-21	PARA GARANTIZAR PAGO OTRO SI 2 ADICION 1 CTO OBRA 201 DE 2021 VIG HASTA (03/12/2021) OBJETO "EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SECTOR ANTIGUO CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL E	900354526	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S	11.955.822,15	2021-12-23 02:07:13

CONCLUSIONES

El seguimiento al comportamiento de las obligaciones con respecto de los proyectos de inversión de la USPEC con corte a 31 diciembre de 2021 refleja que no se realizó ejecución presupuestal correspondiente a los rubros de:

1. Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden nacional.
2. Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional.
3. Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la USPEC Bogotá.



Lo anterior permite determinar que de manera reiterativa existen debilidades de planeación en la ejecución de los recursos del Estado.

1. De los \$3'408.000.000 de pesos apropiados al **proyecto de inversión Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional**, no se realizaron gestiones para la ejecución del proyecto, por lo tanto, tampoco hubo avance físico, de lo anterior, se puede determinar que existen debilidades de planeación en la ejecución de los recursos del Estado.
2. Aunque se realizaron avances físicos y de gestión en **el proyecto de inversión Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional – Nacional**, es importante resaltar que no hubo ejecución de los \$4.000.000.000 apropiados para dicho proyecto.
3. Se evidenció avance de gestión en el proyecto **Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá**, sin embargo, a nivel financiero no hubo ejecución de los \$507.752.614 apropiados al proyecto.
4. Con respecto de las obligaciones de ejecución presupuestal correspondiente a los rubros de construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional y Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC, mostraron un avance a nivel financiero, sin embargo, el porcentaje de ejecución fue muy bajo teniendo en cuenta que los recursos asignados para los proyectos de inversión fueron bastante elevados.
5. Las recomendaciones realizadas en los informes durante la vigencia 2021 no se tuvieron en cuenta, toda vez que de manera reiterada se recomendó la planeación y mesas de trabajo para mejorar las gestiones financieras, físicas y de gestión en los proyectos de inversión de la Unidad.

RECOMENDACIONES.

1. Realizar una planeación adecuada en cada proyecto de inversión, la cual permita la buena ejecución de los recursos y de esta manera evitar detrimentos patrimoniales.
2. En las próximas vigencias realizar mesas de trabajo donde se analice cuales fueron o son los factores que no permitieron realizar los avances financieros, físicos y de gestión en cada proyecto de inversión, lo anterior con el objetivo de determinar las posibles causas y las acciones de mejora frente a los proyectos que la Entidad ejecuta.

Cordialmente,

JUAN FELIPE PALACIO GUZMAN
Coordinadora Grupo Evaluación de la Gestión Institucional

Elaboró: Natali Padrón Aguilar- Profesional Universitario:

Revisó: Alexi Maurely Perdomo Bambague- Coordinadora Grupo Evaluación de la Gestión Institucional:

Ruta: Escritorio- oci2022-coordinacion

Ubicación archivo físico:oci
