

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021**

Bogotá D.C., julio 2021

OBJETIVO

Realizar el seguimiento a los Proyectos de Inversión de la USPEC, de acuerdo con la información reportada al Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno -SISMEG, para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos para su ejecución a 30 de junio de 2021 y determinar la eficiencia y efectividad de los mismos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

ALCANCE

Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión dentro del presupuesto de la Entidad vigencia 2021, así como a la información reportada por la USPEC en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI, verificando los avances de las metas del Sistema Nacional de Gestión y Evaluación -SINERGIA, para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El presente informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión se realiza con corte al 30 de junio de 2021.

NORMATIVIDAD

En el presente ejercicio auditor se tendrán en cuenta las siguientes normas:

- Ley 38 de 1989 modificada por la Ley 179 de 1994.
- Ley 225 de 1995.
- Ley 489 de 1998.
- Ley 819 de 2003 *“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”*.
- Documento CONPES 3294 de 2004- *“Renovación de la Administración Pública: Gestión por Resultados y Reforma del Sistema Nacional de Evaluación”*.
- Decreto 4730 de diciembre 28 de 2005 *“Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto”*.
- Decreto 875 de marzo 27 de 2008 - Artículo 23 - que establece la Oportunidad en el registro de proyectos de Inversión.
- Decreto 2844 de 2010 *“por la cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y del plan nacional de desarrollo”*.
- Resolución No. 000611 de 2013. *“Por la cual se asignan responsabilidades y funciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-SPI Hoy USPEC”*.
- Decreto 1290 de 2014 artículos 08 y 18.
- Decreto 111 de 1996.
- Decreto 178 de 2003.

- Decreto 2789 de 2004.
- Decreto 1957 de 2007.
- Decreto 4150 de 2011.
- Decreto 378 de 2016.
- Decreto 2088 de 2016.
- Resolución 450 de 2003.
- Régimen de Contabilidad Pública.
- Decreto 2170 de 2016.

METODOLGIA

Para efectos del análisis, la ejecución de los proyectos de inversión corresponde al porcentaje de las obligaciones frente a la apropiación vigente de cada proyecto de acuerdo con cifras registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF Nación II.

Con el fin de verificar y efectuar el respectivo seguimiento a información reportada por la Entidad, se procedió a verificar los registros en:

1. Sistema de Proyectos de Inversión SPI con corte a 30 de junio de 2021
2. Información de la Oficina de Gestión Contractual registrada en SECOP
3. Base de contratación con corte a 30 de junio de 2021
4. Base de pagos registrados en SIIF Nación, con corte a 30 de junio de 2021.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos estratégicos dan la USPEC, para la vigencia 2021 son los siguientes:

1. Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.
2. Fortalecimiento de la infraestructura física de los Eron a cargo del Inpec – Nacional.
3. Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.
4. Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.
5. Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional -Nacional

Tal como se evidencia en los pantallazos :

Sector: Justicia y del Derecho
Económico ☒ Presupuestal ☐

Entidad: Spc - Unidad - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAR
Responsable ☒ Ejecutora ☐

Región: (Todas las Regiones)
Departamento: (Todos los Departamentos)

Atributos: Categoría
Sub Atributo: Sistema penitenciario y carcelario en el marco

Sector: Justicia y del Derecho			
Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)
Spc - Unidad	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	0,00 %
Spc - Unidad	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	0,00 %
Spc - Unidad	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	0,42 %
Spc - Unidad	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	0,90 %
No. Proyectos 4			

Sector: Justicia y del Derecho
Económico ☐ Presupuestal ☒

Entidad: Spc - Unidad - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAR
Responsable ☒ Ejecutora ☐

Región: (Todas las Regiones)
Departamento: (Todos los Departamentos)

Atributos: Categoría
Sub Atributo: Fortalecimiento de la gestión y dirección del S

Sector: Justicia y del Derecho			
Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)
Spc - Unidad	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	0,00 %
No. Proyectos 1			

Cabe resaltar que para la vigencia 2021, la Entidad formula cuatro (5) objetivos estratégicos, los cuales se encuentran directamente relacionados con las gestiones misionales y encaminadas a la operación de la Entidad.

INDICADORES DE METAS DE GOBIERNO

Una vez verificado el Sistema de Información SINERGIA del DNP, se evidencia que a la fecha fueron actualizadas las metas de la Entidad con las metas de gobierno de acuerdo con la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019, mediante el cual se expide el Plan nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.


Resumen Anual – Histórico

En el primer semestre de 2021 se realizó la entrega de 1.958 cupos, correspondientes a 1.360 cupos en Infraestructura Rígida de los establecimientos de Ipiales (608 cupos) y Girón (752 cupos), y 598 cupos rehabilitados (recuperación de espacios), con las intervenciones estructurales generadas dentro de los camastros y celdas en los establecimientos de COPED Pedregal (384 cupos), EPMSO Sevilla (32 cupos), EPMSO Pereira (27 cupos), EPMSOAS La Paz Itagüí (47 cupos), EPMSO Neiva (34 cupos) y EPMSO Buga (74 cupos). Es necesario precisar que algunas actas de entrega se suscribieron en el 2020, sin embargo, posterior a la firma de estas, se presentaron observaciones adicionales las cuales fueron subsanadas en el primer semestre del 2021, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad en el territorio nacional y cuarentenas obligatorias decretadas por el Gobierno Nacional, en pro de

prevenir la propagación del COVID- 19. En cuanto a las actividades en el mes de junio no se realizó entrega cupos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente: INFRAESTRUCTURA MODULAR (2040 cupos) se encuentra en Fase 2 armado de acero de refuerzo para escalera, instalación de tubería sanitaria, fundida muros. CONSULTORÍAS: Popayán (800 cupos) Diseño Arquitectónico. Buenaventura (600) Diseño Arquitectónico. Barrancabermeja (1500 cupos) Culminación Anteproyecto arquitectónico, diagnóstico arqueológico. Villa Hermosa Cali (4500 cupos) levantamiento topográfico y labores de patología. INFRAESTRUCTURA RÍGIDA: Pereira (900 cupos) contrato ENTerritorio, firma del Acta de inicio y entrega del predio el 30 de junio de 2021 en las instalaciones de la alcaldía de Pereira, con lo cual se iniciará la construcción de la primera fase del proyecto. Bellavista patio 2 (408 cupos) se está adelantando el trámite de inclusión de obras adicionales solicitadas por el Establecimiento para mejorar el funcionamiento y seguridad del pabellón, tales como: doble Cerramiento para conformación de área de Guyana, estructura y cubierta en acceso a pabellones No. 2 y 5, mejoramiento del área de piso y muros en acceso al pabellón No. 2. ERON Renacimiento (1.500 cupos) preliminares como el descapote y nivelación del terreno para edificaciones (Alrededor de 26.790 m2), adecuación y conformación de las vías internas (Alrededor de 22138 m2), la realización de 2.070 ml de cerramiento provisional, la construcción de campamentos, la implementación de la PTAR provisional para el campamento, la construcción del pozo séptico, el levantamiento topográfico de nuevos componentes, la instalación e izaje de seis torre grúa, la implementación de dos plantas de concreto, el inicio de la perforación mecánica de un segundo pozo de agua profunda, el inicio de las actividades de urbanismo y así mismo, el inicio de la cimentación para el cerramiento definitivo. ERON Riohacha (1500 cupos), Se suscribió acta de inicio el 22 de junio de 2021, aprobación de las hojas de vida del contratista de obra. Medellín P4 (520 cupos) Se suscribió acta de inicio el 23 de junio de 2021, revisión y aprobación de hojas de vida.

Fecha de corte: 30/06/2021

Fecha de actualización: 09/07/2021

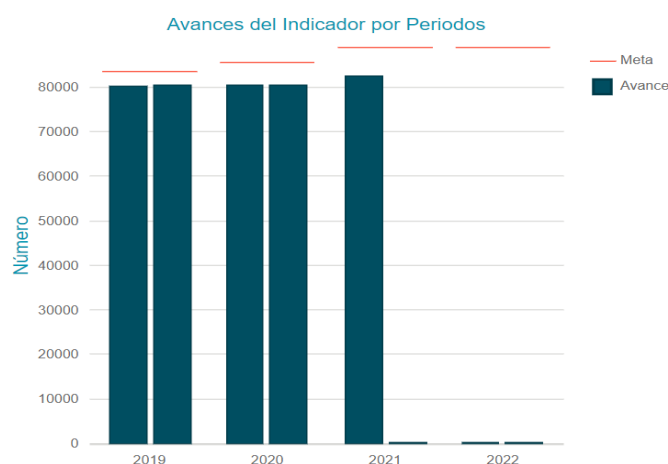

Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/946/6158/83>

COMPORTAMIENTO ANUAL DEL INDICADOR

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea Base	-	80.227,00	-
Ene-Dic 2019	83.619,00	80.579,00	10.3800%
Ene-Dic 2020	85.539,00	80.579,00	6.6300%
Ene-Dic 2021	88.887,00	82.537,00	26.6700%
Ene-Dic 2022	88.887,00	-	-
2018-2022	88.887,00	82.537,00	26.6700%

Descripción del Indicador:

El indicador mide el número de cupos entregados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los actuales y en los nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) durante el cuatrienio.

Metas de gobierno:

2018-2022	Ene-Dic 2019	Ene-Dic 2020	Ene-Dic 2021	Ene-Dic 2022
88.887,00	83.619,00	85.539,00	88.887,00	88.887,00

Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/946/6158/83>

GESTIÓN FINANCIERA

El Decreto 2482 de 2012 compone la Planeación y la Gestión de las Entidades, como instrumento de articulación y reporte de la Planeación y adopta las políticas de Desarrollo Administrativo, entre otras las de Gestión Financiera que es la política integrada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la Entidad. Constituye las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios y la gestión de proyectos de inversión.

Para la vigencia 2020, el rubro de inversión está conformado por cinco (5) proyectos de inversión, los cuales se relacionan a continuación:

2018011000292 - IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL.

2018011000317- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - NACIONAL.

2018011000329- CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN

DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN – NACIONAL

2018011000336- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC – NACIONAL

2018011000466- FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto 2018011000292 - Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.

Objetivo General

Mejorar los espacios para el desarrollo de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del Orden Nacional.

Objetivos Específicos

- Contar con las áreas necesarias para la realización de audiencias judiciales en los ERON
- Ampliar la cobertura de la realización de audiencias judiciales en los ERON

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos
Evolución primer semestre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inversión	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Este proyecto cuenta con una apropiación por valor de \$3.408.000.000, se han obligado \$0 comprometido \$0 y pagado un valor de \$0, correspondiente al avance Financiero del 0,00%, Físico 0,00%, y de Gestión 0,00%, a junio 2021 valor solicitado \$6.940.614.421, en la ejecución del proyecto de inversión relacionado.

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000292>

Proyecto 2018011000317- Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional

Objetivo general

Fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de la población privada de la libertad.

Objetivos específicos

- Mejorar el sistema de recolección y custodia de las evidencias de la comisión de delitos
- Aumentar los recursos técnicos y tecnológicos de apoyo a la seguridad en los ERON

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos

Evolución primer semestre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inversión	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Mediante a la verificación realizada en el SPI, se evidencia una apropiación por valor de \$4.000.000.000, en el primer semestre de 2021 se ha solicitado \$5.168.759.489, se han obligado \$0, pagado un valor de \$0, y comprometido \$0, correspondiente al avance Financiero del 0,00%, Físico 0,00%, y de Gestión 0,00% en la ejecución del proyecto con corte del primer semestre de 2021, con un saldo inicial de \$4.000.000.000 y vigente \$4.000.000.000.

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000317>

Proyecto 2018011000329- Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.

Objetivo general

Disminuir el hacinamiento en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional

Objetivos específicos

- Aumentar el número de cupos penitenciarios y carcelarios para atender a la PPL
- Obtener información técnica eficiente para dar viabilidad a nuevos proyectos de construcción y ampliación de cupos

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.

Evolución primer semestre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inversión	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652
Avance Financiero	0,00%	0,02%	0,08%	0,14%	0,21%	0,42%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	1,50%	10,50%	28,20%	21,00%	27,60%	31,20%

Conforme al presente proyecto se evidencia una apropiación por valor de \$260.221.745.652, se han obligado \$1.099.699.298, comprometido \$219.042.548.047 y pagado un valor de \$1.002.569.867, correspondiente al avance Financiero del 0,42%, Físico 0,00%, y de Gestión 31,20% en la ejecución del proyecto con corte 30 de junio de 2021.

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000329>

Proyecto 2018011000336 - Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional

Objetivo general

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la Población Privada de la Libertad en los ERON

Objetivos específicos

- Adecuar la Infraestructura física de los ERON
- Fortalecer el tratamiento de agua potable y residual en los ERON

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.

Evolución primer semestre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inversión	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734
Avance Financiero	0,00%	0,03%	0,13%	0,34%	0,58%	0,90%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,00%
Avance Gestión	2,10%	2,45%	4,00%	5,05%	7,90%	18,25%

En el presente proyecto se encuentra una apropiación por valor de \$83.281.301.734, se han obligado \$747.339.359, comprometido \$25.688.249.882 y pagado un valor de \$746.334.721, correspondiente al avance Financiero 0,90%, Físico 27,00%, y de Gestión 18,25% en la ejecución del proyecto con corte a junio de 2021.

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000336>

2018011000466-Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.

Objetivo general

Fortalecer la aplicación de la Gestión Documental

Objetivos específicos

- Implementar herramientas tecnológicas del Sistema de Gestión Documental
- Generar buenas prácticas en los procesos Archivísticos de la entidad

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa: 1299 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector justicia y del derecho

Evolución segundo semestre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inversión	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	3,30%	3,30%	3,30%

El presente proyecto se encuentra una apropiación por valor de \$507.752.614, se han obligado \$0, comprometido \$0 y pagado un valor de \$0, correspondiente al avance Financiero del 0,00%, Físico 0,00%, y de Gestión 3,30% en la ejecución del proyecto con corte a junio 30 de 2021.

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000466>

AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE A 30 DE DICIEMBRE 2020
1. 2018011000292 - Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.	\$3.408.000.000	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 00,00% De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de junio de 2021 no se evidencian pagos realizados durante el primer semestre del 2021 en el presente proyecto de inversión.
2. 2018011000317- Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional - Nacional.	\$4.000.000.000	Financiero: 0,00% Físico: 00,00% Gestión: 00,00% De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de junio de 2021 no se evidencian pagos realizados durante el primer semestre del 2021 en el presente proyecto de inversión.
3. 2018011000329- Construcción ampliación de	\$260.221.745.652	Financiero: 0,42% Físico: 00,00% Gestión: 31,20%



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2021

infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional		De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de junio de 2021 se realizaron 173 pagos los cuales suman un total de \$1'097.583.476,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de junio de 2021 se evidencian 112 Contratos de Prestación de Servicios y prestación de servicios profesionales los suman un valor de \$ 716'843.820,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de junio de 2021 se realizaron 3 pagos por contratos de obras los cuales suman un valor de \$346'448.679,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de junio de 2021 se evidencian 58 pagos de actos administrativos (pago comisiones) los suman un valor de \$34'290.977,00
4. 2018011000336- Fortalecimiento de la infraestructura física de los Eron a cargo del Inpec – Nacional	\$83.281.301.734	Financiero: 0,90% Físico: 27,00% Gestión: 18,25% Una vez verificado en el CEN de pagos, se evidencia que a 30 de junio de 2021 se realizaron 193 pagos los cuales suman un valor de \$746'334.721,33. Discriminados de la siguiente manera: De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de junio de 2021 se evidencian 139 Contratos de Prestación de Servicios y prestación de servicios profesionales los suman un valor de \$ 722'424.372,33 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de junio de 2021 se realizaron 54 pagos de Orden de compras (Pago comisiones) las cuales suman un valor de \$23'910.394,00

5. 2018011000466- Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.	\$507.752.614	Financiero: 00,00% Físico: 00,00% Gestión: 03.30% De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de junio de 2021 no se evidencian pagos realizados durante el primer semestre del 2021 en el presente proyecto de inversión.
--	-----------------------------	---

- A continuación, se amplía información sobre los 3 contratos de obra realizados en el marco del proyecto de inversión Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.

Fecha Doc Soporte Compromiso	Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso	Identificación	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Fecha de pago
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 272 DE 2020	ADICION 1 CONTRATO 272 DE 2020 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS SECTORES ANTIGUOS CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL EPAMS GIRON 15 DE MARZO DE 2021 HASTA	830045040	AQSERV S A S	142.835.206,00	2021-06-30 04:28:12
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS SECTORES ANTIGUOS CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL EPMSC IPIALES, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	901415289	MIA GRUPO EMPRESARIA L SAS	108.599.864,25	2021-06-30 04:39:27
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS SECTORES ANTIGUOS CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL EPMSC IPIALES, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	901415289	MIA GRUPO EMPRESARIA L SAS	95.013.608,75	2021-07-01 03:56:43


CONCLUSIONES

- El seguimiento al comportamiento de las obligaciones con respecto de los proyectos de inversión de la Uspec con corte a 30 de junio de 2021 refleja lo siguiente: no se realizó ejecución presupuestal correspondiente a los rubros de **Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional, Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional – Nacional y Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá**. Lo anterior permite determinar que de manera reiterativa existen debilidades de planeación en la ejecución de los recursos del Estado.

- Si bien es cierto las obligaciones de ejecución presupuestal correspondiente a los rubros de **Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional y Fortalecimiento de la infraestructura física de los Eron a cargo del Inpec – Nacional**, con corte del primer semestre de la presente vigencia muestran un avance a nivel financiero estos no son significativos teniendo en cuenta que los recursos asignados para los proyectos de inversión son bastante elevados y su porcentaje de ejecución para mitad de vigencia no se acerca ni al 10% de ejecución financiera.
- Las recomendaciones realizadas en los informes anteriores no se han tenido en cuenta, toda vez que de manera reiterada se recomienda la planeación y mesas de trabajo para mejorar las gestiones financieras, físicas y de gestión en los proyectos de inversión de la Unidad.

8. RECOMENDACIONES.

- Realizar una planeación en cada proyecto de inversión, la cual permita la buena ejecución de los recursos.
- Realizar mesas de trabajo donde se analice cuales fueron o son los factores que no permitieron realizar los avances financieros, físicos y de gestiones en cada proyecto de inversión, lo anterior con el objetivo de encontrar las posibles causas y las acciones de mejora.



ALEXI MAUREDY PERDOMO BAMBAGUE
Coordinadora Grupo Evaluación de la Gestión Institucional

Elaboró: Natali Padrón Aguilar- Profesional Universitario 

Revisó: Alexi Mauredy Perdomo Bambague- Coordinadora Grupo Evaluación de la Gestión Institucional

Ruta:

Ubicación archivo físico:

